


Software Engineering Projekt

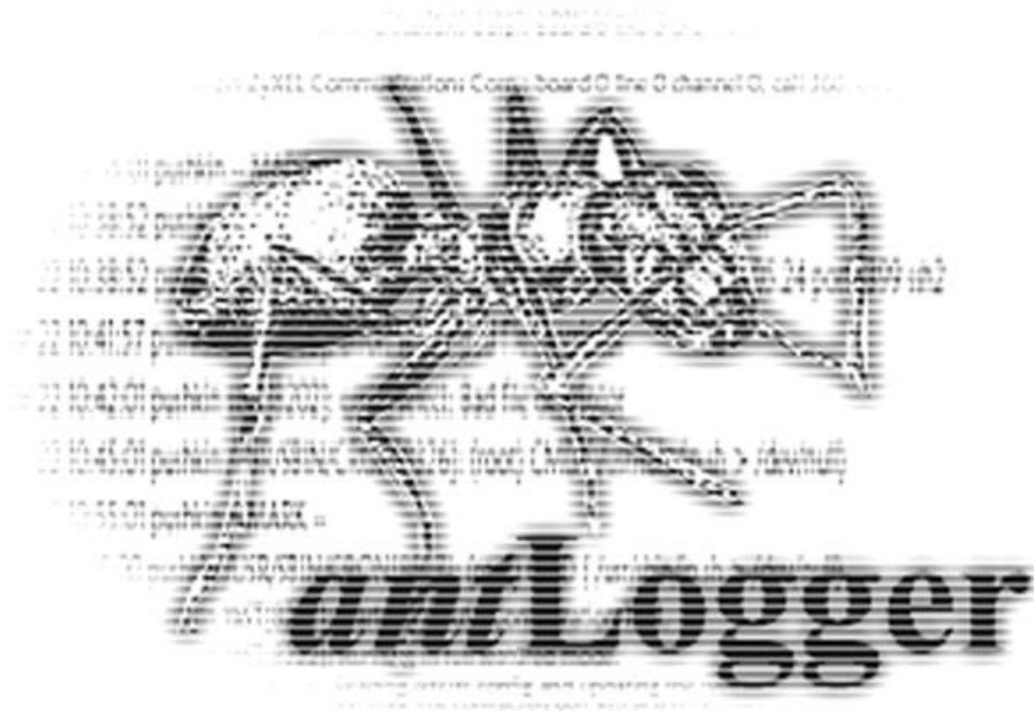

Risiko Analyse

Version 1.0

Patrick Bründler, Pascal Mengelt, Andy Wyss, Fabian Heusser
Dozent: Jörg Hofstetter

History

Nr	Version	Datum	Name	Beschreibung
1	0.1	20.3.2002	men	Erste Bestandesaufnahme
2	1.0	27.3.2002	men	Verbesserungen
3	1.0	10.4.2002	men	Wöchentliche Aktualisierung
4	1.0	20.4.2002	men	Wöchentliche Aktualisierung
5	1.0	30.4.2002	men	Wöchentliche Aktualisierung

Risiko Aufstellung

#	Risiko	Wahrscheinlichkeit 1 bis 10 1 = sehr unwahrscheinlich	Folgen 1 bis 10 1=kaum Folgen	Bewältigungskosten 1 bis 10 1=kleinste Kosten	Resultierende Priorität Kleinste Zahl hat grösste Priorität	Bewältigungs-/ Lösungsplan	Verantwortlich	Erledigen bis xxx während des ganzen Projektes	Status o: offen we: wird erledigt e: erledigt
1	TCP/IP Stack Parallel Streams	8	8	5	45	Mit Einsatz wett machen	alle	xxx	e
2	Parallelität, Synchronisation- Probleme	5	5	2	72	Prototyp	wys	17.04.2002	e
3	Daten Verlust (Dokumente)	4	7	3	84	Einführen eines Dokument Management	heu	27.03.2002	e
4	Begrenzung der Log-File Grösse	3	7	3	96	Prototyp	bru	10.04.2002	e
5	Probleme mit Interface – Änderung kaum möglich	3	7	4	128	Lösungsvorschlag gut überprüfen. Schwerpunkt auf Interface in 1. Phase	wys	03.04.2002	e
6	CVS – Dokument Management	5	3	3	144	braucht eine saubere Einführung	heu	27.03.2002	e
7	Lesen und Schreiben von grossen Dateien (Performance)	6	6	6	150	Möglichkeiten ausarbeiten	men	-	e
8	Stream Inputs (TCP/IP Stack)	5	5	5	180	Prototyp	men	-	e
9	Dokumente werden nicht nachgeführt	5	4	5	210	Für jedes Dokument gibt es einen Verantwortlichen	alle	xxx	xxx
10	Person fällt aus	2	7	10	360	die Themen werden überschneidend behandelt	alle	xxx	xxx
11	Unerfahrenheit	4	4	10	490	Mit Einsatz wett machen	alle	xxx	xxx
